

Bilan du Plan de travail 2024-2025 Restauration des sites miniers abandonnés

Septembre 2025

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORÊTS



Note au lecteur

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) produit un bilan annuel du plan de travail afin de présenter les actions réalisées dans le cadre de la restauration des sites miniers abandonnés inscrits sous sa responsabilité au Passif au titre des sites contaminés (PTSC). Les obligations liées au réaménagement et à la restauration de sites contaminés sous la responsabilité du gouvernement ou pouvant, de façon probable, relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à titre de PTSC.

Pour le présent exercice, l'ensemble des données présentées est en date du 31 mars 2025 à l'exception des changements de catégories des sites miniers abandonnés, et ce, afin de faciliter la comparaison des données entre le bilan et le plan de travail. Il est à noter que les changements de catégories seront intégrés au Plan de travail 2025-2026.

Réalisation

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Direction de la restauration des sites miniers

5700, 4^e Avenue Ouest, bureau C-318

Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6278

1 800 363-7233 (sans frais au Canada et aux États-Unis)

Courriel : services.mines@mrnf.gouv.qc.ca

Diffusion

Cette publication est accessible en ligne à l'adresse :

<https://mrnf.gouv.qc.ca/mines/restauration-miniére/restauration-des-sites-miniers-abandonnes/>

Photographies de la page couverture :

Site Asbury Graphite, ministère des Ressources naturelles et des Forêts

© Gouvernement du Québec

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Dépôt légal — Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2025

ISBN 978-2-555-01993-5 (PDF)

ÉTAPES D'UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Étape	Activité	Description
Acquisition de données	Réalisation d'études de caractérisation environnementale de site (CES) — phases I, II et III	Ensemble des actions qui permettent de déterminer les risques de contamination et leurs emplacements, la présence et l'envergure de la contamination (le cas échéant) ainsi que les enjeux et les répercussions qui en découlent.
	Réalisation d'études connexes	Études dans des domaines tels que la géotechnique, la mécanique des roches, etc., pouvant être requises en fonction des particularités de chaque site minier abandonné.
Scénarios et plan de restauration	Élaboration de scénarios de restauration	Détermination des critères de conception adaptés à chaque site pour tenir compte de ses particularités et de ses enjeux.
	Validation et sélection du ou des scénarios de restauration	Validation du ou des scénarios de restauration à partir, notamment, d'une analyse de risques, d'une révision par les pairs et d'études de validation, le cas échéant.
	Élaboration du plan de restauration	Conception de l'ingénierie préliminaire pour un ou plusieurs scénarios de restauration.
	Obtention des autorisations pour les travaux de restauration	Demandes de permis et autorisations auprès des ministères et organismes provinciaux ainsi que fédéraux, des municipalités, etc., pour chacune des phases des travaux associées au plan de restauration.
	Préparation des plans et devis pour construction associés au plan de restauration	Documents techniques décrivant les travaux en vue de leur réalisation par un entrepreneur.
Travaux de restauration	Réalisation des travaux de restauration	Mise en œuvre du ou des scénarios de restauration élaborés, y compris l'attribution de contrats à un ou des entrepreneurs pour la réalisation des travaux, le suivi de la réalisation et l'acceptation finale des travaux.
Suivi et entretien postrestauration	Suivi de la qualité environnementale des eaux (de surface et souterraines)	Activités permettant de vérifier si les travaux réalisés atteignent les objectifs environnementaux.
	Suivi agronomique	Activités permettant de vérifier si les travaux réalisés atteignent les objectifs agronomiques.
	Entretien des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes	Activités permettant d'assurer la pérennité des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes faisant partie du plan de restauration.

AUTRES ACTIVITÉS REQUISES PENDANT LES ÉTAPES MENANT À UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Étape	Activité	Description
Activité requise jusqu'à l'étape des scénarios de restauration et du plan de restauration	En cours de planification	Planification requise pour les sites pour lesquels une étude de CES ou des scénarios de restauration doivent débiter.
Activités pouvant être requises à chacune des étapes d'un projet de restauration	Application du <i>Cadre de référence pour la gestion des sites contaminés sous la responsabilité de l'État</i>	Le Cadre de référence prévoit des méthodes de travail permettant de classer les sites et de prioriser les interventions, en fonction des risques associés à la santé humaine et à l'environnement, par l'obtention de cote. Ainsi, des délais maximaux recommandés pour entreprendre les interventions de caractérisation environnementale et de restauration sont obtenus pour chaque cote. Ces méthodes doivent continuer à être appliquées à chaque étape afin de déterminer la cote appropriée. Les cotes de priorisation (caractérisation ou restauration) pouvant être obtenues et leurs délais respectifs sont les suivants : CARACTÉRISATION – PC-3 (3 ans) – PC-2 (5 ans) – PC-1 (7 ans) RESTAURATION (SCÉNARIOS DE RESTAURATION) – PI-3M (5 ans) – PI-2M (10 ans) – PI-1M (15 ans)
Activité requise avant l'application du Cadre de référence	En cours d'évaluation	Procéder à l'évaluation des sites miniers abandonnés qui pourraient être introduits ou réintroduits en responsabilité réelle au PTSC en fonction des critères de référence de contamination ou des conclusions de vérification juridique.

Sommaire des activités réalisées en 2024-2025


Étapes de restauration d'un site minier abandonné		Nombre de sites en 2024-2025	Budget prévu (k\$)	Dépenses réelles (k\$)
Acquisition de données	Études de CES — phases I, II ou III	29	1 019,4	334,9
	Études connexes	1	648,0	405,7
Scénarios et plans de restauration		1	500,0	563,8
Travaux de restauration		4	37 866,0	27 429,9
Suivi et entretien postrestauration		17	1 200,5	1 115,5
Autres activités requises pendant la réalisation d'un projet de restauration d'un site minier abandonné sous la responsabilité de l'État ou autres sites pouvant être introduits ou réintroduits en responsabilité réelle au PTSC		Nombre de sites en 2024-2025	Budget prévu (k\$)	Dépenses réelles (k\$)
En cours de planification		294	131,5	511,7
TOTAL (Sites miniers abandonnés inscrits au PTSC sous la responsabilité réelle du MRNF)		346	41 365,4	30 361,5
En cours d'évaluation		7	—	—
TOTAL (incluant les sites miniers abandonnés en évaluation)		353	41 365,4	30 361,5

Faits saillants 2024-2025

Coûts totaux prévus pour les travaux de restauration : 37,9 M\$

Dépenses réelles totales pour les travaux de restauration : 27,4 M\$

Sites miniers en cours de restauration 2024-2025

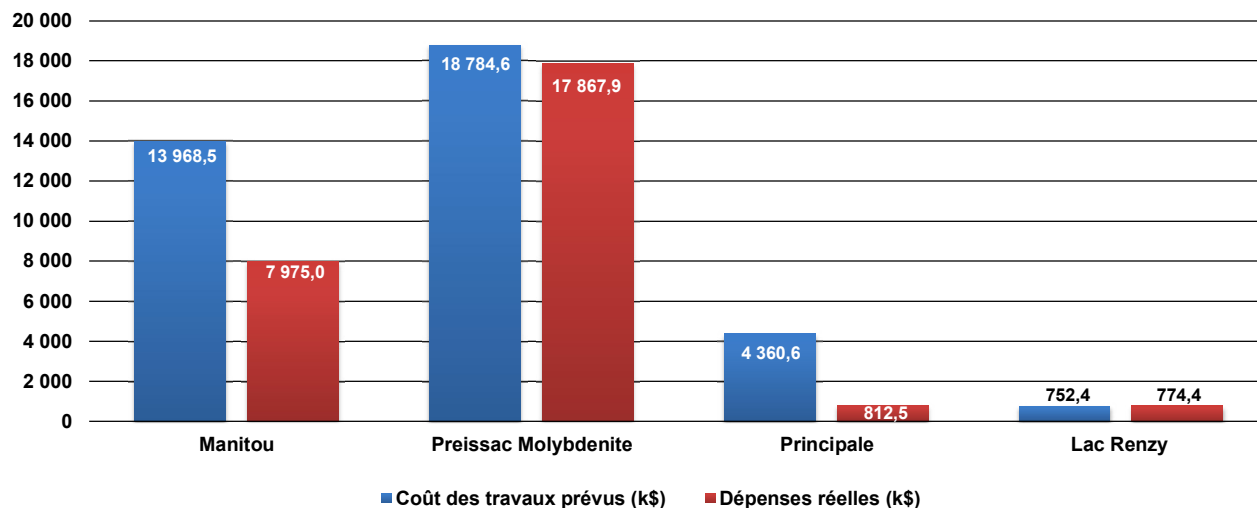

Faits saillants 2024-2025 (suite)

Acquisition de données (études de CES — phases I, II ou III)

L'écart observé (soit 649,2 k\$) entre les dépenses réelles (82,8 k\$) et les coûts estimés des travaux (732,0 k\$) est associé principalement à l'étude de CES — phase III qui n'a pu être entamée pour le site Asbestos Hill.

Tous les historiques de site ont été réalisés, sauf pour les sites Arntfield, Guinard, Pierre-Beauchemin et Quésabé. Ces derniers seront réalisés en 2025-2026. Il est à noter que les dépenses réelles varient d'un site à l'autre en fonction de la quantité de documents historiques répertoriés ainsi que de la complexité du site.

Acquisition de données (études connexes)

L'étude géotechnique pour le site Dairus (O'Brien) a été entamée et se poursuit en 2025-2026.

Scénarios de restauration

Des travaux et des études complémentaires ont été effectués parallèlement à la poursuite des scénarios de restauration pour le site St-Lawrence Columbian.

Réalisation de travaux de restauration

Les dépenses réelles (27 429,9 k\$) ont été inférieures au montant prévu (37 867,0 k\$) puisque :

- les travaux de construction de la couverture à effet de barrière capillaire au site Manitou (13 968,5 k\$ prévus contrairement à 7 975,0 k\$ dépensés) n'ont pas débuté comme prévu en raison de délais liés à l'obtention de l'autorisation requise pour leur réalisation.
- les discussions sont toujours en cours pour le premier lot de travail lié au contrat global signé avec l'entreprise Construction Éconord inc. pour les travaux de restauration du site Mine Principale (4 361,6 k\$ prévus contrairement à 812,5 k\$ dépensés).
- les coûts des travaux de restauration au site Preissac Molybdenite ont été moindres que prévu (18 784,6 k\$ planifiés contrairement à 17 867,9 k\$ dépensés).

Suivi et entretien postrestauration

De manière globale, les dépenses réelles totales correspondent à celles inscrites dans le budget total prévu. Cependant, des écarts à la hausse ou à la baisse sont observés pour certains sites. Ces écarts s'expliquent principalement par des travaux supplémentaires réalisés ou des travaux débutés, mais non terminés, ou encore des travaux n'ayant pas été réalisés.

En cours de planification

Les dépenses réelles sont, de manière générale, plus élevées que les coûts prévus étant donné que les inspections et les rapports produits ont été bonifiés. De plus, certains sites (Asbury Graphite, Chimo, Copper Rand [parc], Icon Sullivan, Joe Mann (parc), Lac Jeannine, Lemoine, les sites à Schefferville (excluant le dépôt pétrolier), Molybdenite Corporation, Normetmar, Siscoe, St-Roberts-Metals, Van Reet et Vauze) ont nécessité l'analyse de documents (ex. : rapport de caractérisation) pour la planification d'activités subséquentes ou pour des suivis internes.

En cours d'évaluation

L'évaluation de la présence potentielle de contamination pour les carrières et les sablières est toujours en cours.

ACQUISITION DE DONNÉES (études de CES — phases I, II ou III)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Anglo-Rouyn	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	8,4
Abitibi-Témiscamingue	Ansil	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	8,8
Abitibi-Témiscamingue	Arntfield	1	Historique du site	10,0	L'historique du site n'a pas été réalisé, mais une inspection et l'analyse de la documentation ont été effectuées	12,3
Abitibi-Témiscamingue	Bouscadillac	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	3,1
Abitibi-Témiscamingue	Claverny	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	8,0
Abitibi-Témiscamingue	Cournor	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	7,0
Abitibi-Témiscamingue	Donalda	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	9,5
Abitibi-Témiscamingue	Dorval-Beacon (parc)	1	Historique du site	8,4	Historique du site terminé	1,5
Abitibi-Témiscamingue	East-Waite	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	2,1
Abitibi-Témiscamingue	Guinard	1	Historique du site	10,0	L'historique du site n'a pas été réalisé, mais une inspection a été effectuée	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Kewagama	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	2,3
Abitibi-Témiscamingue	Lapa (Zulapa)	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	14,9
Abitibi-Témiscamingue	McWatters	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	12,9
Abitibi-Témiscamingue	Nortrac	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	14,5
Abitibi-Témiscamingue	Pandora	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	11,1
Abitibi-Témiscamingue	Pierre Beauchemin	1	Historique du site	10,0	L'historique du site n'a pas été réalisé, mais une inspection a été effectuée	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Powell (Rouyn)	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	8,0
Abitibi-Témiscamingue	Quésabé	1	Historique du site	10,0	L'historique du site n'a pas été réalisé, mais une inspection et l'analyse de documentation ont été effectuées	6,6
Abitibi-Témiscamingue	Silidor	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	9,9
Abitibi-Témiscamingue	Swanson	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	9,0
Abitibi-Témiscamingue	Thompson Cadillac	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	25,3
Abitibi-Témiscamingue	Waite Ackerman	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	4,8
Abitibi-Témiscamingue	Waite-Amulet	1	Historique du site	19,0	Historique du site terminé	14,4
Abitibi-Témiscamingue	Wendell	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	8,1
Abitibi-Témiscamingue	West Malartic	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	7,8
Nord-du-Québec	Asbestos Hill	1	Étude de CES — phase III	732,0	L'étude de CES — phase III n'a pu être entamée, mais une inspection a été réalisée, et les travaux de recherche se sont poursuivis	82,8
Nord-du-Québec	Flordin	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	10,8
Nord-du-Québec	Lac Garon	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	8,8
Nord-du-Québec	Rollmac	1	Historique du site	10,0	Historique du site terminé	19,0
TOTAL		29		1 019,4		334,9

ACQUISITION DE DONNÉES (études connexes)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Darius (O'Brien)	1	Étude géotechnique et préparation d'une étude de CES — phase III	648,0	L'étude géotechnique a été débutée et se poursuit en 2025-2026. L'étude de CES — phase III a aussi été préparée, et un projet de recherche a été démarré.	405,7
TOTAL		1		648,0		405,7

SCÉNARIOS DE RESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Laurentides	St-Lawrence Columbium	1	Poursuite des scénarios de restauration et obtention du rapport final de l'étude géomécanique	500,0	Des travaux et des études complémentaires ont été effectués parallèlement à la poursuite des scénarios de restauration. Le rapport final de l'étude géomécanique sera donc obtenu en 2025-2026.	563,8
TOTAL		1		500,0		563,8

RÉALISATION DE TRAVAUX DE RESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Manitou	1	Déposition de résidus provenant de la mine Goldex et début de la construction de la couverture à effet de barrière capillaire (CEBC)	13 968,5	La déposition des résidus Goldex s'est poursuivie. Les travaux de construction de la CEBC n'ont pas débutés en raison de délais pour l'obtention de l'autorisation de leur réalisation.	7 975,0
Abitibi-Témiscamingue	Preissac Molybdenite	1	Travaux de stabilisation des anciens chantiers d'abattage, démolition des structures de béton, et poursuite de la conception et de l'ingénierie pour la restauration	18 784,6	Les travaux prévus ont tous été réalisés.	17 867,9
Nord-du-Québec	Principale	1	Travaux de démolition complétés en 2023-2024. De nouvelles activités sont à réaliser à l'exception de la conception de l'ingénierie qui se poursuit. Début des travaux de restauration du parc A (ouverture de la carrière) et des travaux de réhabilitation des stériles contaminés aux hydrocarbures. Poursuite de la conception de l'ingénierie préliminaire et détaillée pour la restauration des parcs B et C	4 360,6	Le contrat global avec l'entreprise Construction Éconord inc. a été négocié et signé en janvier 2024-2025. Les discussions pour le premier lot de travail sont toujours en cours. La conception de l'ingénierie préliminaire et détaillée pour la restauration des parcs B et C s'est poursuivie.	812,5
Outaouais	Lac Renzy	1	Gestion des sols contaminés au xanthate	752,4	Les sols contaminés au xanthate sont gérés comme prévu, et un projet de recherche a été démarré.	774,4
TOTAL		4		37 866,0		27 429,9

SUIVI ET ENTRETIEN POSTRESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Aldermac	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	200,0	Échantillonnage d'eau, inspection du site, trappage de castors et travaux de recherche. Travaux réparateurs sur la cellule de confinement et d'aménagement de planches d'essai de remise en végétation.	199,0
Abitibi-Témiscamingue	Barvue	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	27,0	Échantillonnage d'eau, inspection du site et travaux de recherche.	28,2
Abitibi-Témiscamingue	East-Sullivan	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	91,5	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Réfection d'un chemin et travaux d'ingénierie pour la gestion des niveaux d'eau et des digues (y compris leur débroussaillage). Démarrage d'un projet de recherche.	153,4
Abitibi-Témiscamingue	Les Terrains Aurifères	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	220,6	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Travaux de remise en végétation.	186,5
Abitibi-Témiscamingue	Lorraine	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	25,0	Échantillonnage d'eau, inspection du site et travaux de recherche.	31,6
Abitibi-Témiscamingue	Normétal	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	123,5	Échantillonnage d'eau, inspection du site et travaux de recherche. Nettoyage des fossés déversoirs pour assurer la libre circulation de l'écoulement de l'eau.	126,3
Abitibi-Témiscamingue	Preissac	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	220,6	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Étude d'évaluation de sécurité des ouvrages de retenue de résidus miniers débutée.	82,8
Abitibi-Témiscamingue	Stadacona	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	20,2	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	25,3
Abitibi-Témiscamingue	Wood Cadillac	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	33,4	Échantillonnage d'eau, inspection du site, trappage de castors et travaux de recherche.	35,4
Côte-Nord	Sablière 12K05-001	1	Suivi environnemental	20,0	Aucuns travaux réalisés	0,0
Estrie	Eustis	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	81,5	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Des coûts étaient prévus pour la vidange du bassin de sédimentation, cependant, il s'est avéré que cette vidange n'était pas requise.	26,5
Estrie	Suffield	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	24,1	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	17,1
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Candego	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	21,0	Échantillonnage d'eau, inspection du site et débroussaillage pour les chemins d'accès.	41,4
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Mines Madeleine	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	20,8	Échantillonnage d'eau, inspection du site et préparation de mandats pour des activités d'entretien postrestauration (ex. : étude géotechnique).	58,4
Mauricie	Somex	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	22,4	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	19,7
Nord-du-Québec	Opémiska	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	22,4	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	26,0
Outaouais	New Calumet	1	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	26,5	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Inspection statutaire du barrage et réalisation de travaux d'entretien (ex. : nettoyage des canaux de drainage) et trappage de castors.	57,9
TOTAL		17		1 200,5		1 115,5

EN COURS DE PLANIFICATION (sites pour lesquels une étude de CES ou un scénario de restauration est prévu)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Abbeville	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Abcourt (halde)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	2,3
Abitibi-Témiscamingue	Adanac	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Akasaba	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	6,3
Abitibi-Témiscamingue	Arrowhead	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Aubelle	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,7
Abitibi-Témiscamingue	Beaudry (carrière)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Beattie (parc)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site	9,2
Abitibi-Témiscamingue	Belleterre (infrastructures)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	5,3
Abitibi-Témiscamingue	Bevcon	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	4,9
Abitibi-Témiscamingue	Black Cliff	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9
Abitibi-Témiscamingue	Blairdon	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	1,2
Abitibi-Témiscamingue	Blondeau Nickel	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Buffadison	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	2,3
Abitibi-Témiscamingue	Chimo	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site et analyse de documents	13,5
Abitibi-Témiscamingue	Claremont	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	1,6
Abitibi-Témiscamingue	Delbridge	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Denain	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	3,5
Abitibi-Témiscamingue	Duvan Copper	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Fisher	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Fontana	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site	2,5
Abitibi-Témiscamingue	Garney	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Granada (ancien parc)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site et démarrage de projet de recherche.	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Inmont Copper	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site	1,5
Abitibi-Témiscamingue	Lac Fortune Ouest	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Lacoma	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	6,1
Abitibi-Témiscamingue	Lapaska	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9

EN COURS DE PLANIFICATION (sites pour lesquels une étude de CES ou un scénario de restauration est prévu)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Lucien Béliveau	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	9,8
Abitibi-Témiscamingue	Molybdenite Corporation	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site et analyse de documents	8,6
Abitibi-Témiscamingue	New Bidlamaque	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	2,8
Abitibi-Témiscamingue	New Marlon	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,1
Abitibi-Témiscamingue	Normetmar	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site et analyse de documents	10,6
Abitibi-Témiscamingue	Perron	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	2,8
Abitibi-Témiscamingue	Québec Explorers	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	4,3
Abitibi-Témiscamingue	Québec Lithium (ancien parc)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	3,2
Abitibi-Témiscamingue	Randall	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Regcourt	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	5,6
Abitibi-Témiscamingue	Resenore	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	2,8
Abitibi-Témiscamingue	Sablère 32C04-014	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Simon Ouest	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	2,3
Abitibi-Témiscamingue	Siscoe	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	7,5	Vigie (inspection) du site	21,8
Abitibi-Témiscamingue	South Tiblémont	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Stabell	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9
Abitibi-Témiscamingue	Standard Gold Mines	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9
Abitibi-Témiscamingue	Sullivan	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	2,8
Abitibi-Témiscamingue	Vauze	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site, analyse de documents et démarrage de projet de recherche	17,2
Abitibi-Témiscamingue	Venus	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9
Abitibi-Témiscamingue	Vianor	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Wrightbar	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	2,4
Bas-Saint-Laurent	Uniquartz	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Chaudière-Appalaches	Continental	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	8,9
Chaudière-Appalaches	Montréal (Coleraine)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,1
Chaudière-Appalaches	Reed-Bélanger	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,2

EN COURS DE PLANIFICATION (sites pour lesquels une étude de CES ou un scénario de restauration est prévu)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Côte-Nord	Lac Jeannine	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	6,0	Vigie (inspection) du site et analyse de documents	32,2
Côte-Nord	French (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Burnt Creek (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Rowe (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Ferriman (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Gagnon (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Gagnon-A (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Star Creek (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Knox (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Retty (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Fleming n°3 (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Fleming n°7 (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée, mais analyse de documents effectuée	3,7
Côte-Nord	Dépôt pétrolier (Schefferville)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Estrie	Albert	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,1
Estrie	Clinton	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,4
Estrie	Cupra	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,5
Estrie	High Water	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,1
Estrie	Marcoux	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,2
Estrie	Moulton Hill	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,0
Estrie	St-Robert-Metals	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site et analyse de documents	15,1
Estrie	Van Reet	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site et analyse de documents	10,8
Estrie	Weedon	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,2
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Fédéral 22B16	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	9,4
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Sullipek	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	8,6
Laurentides	Asbury Graphite	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site et inspection statuaire des digues, trappage de castors et analyse de documents.	16,1
Nord-du-Québec	Abitibi-Asbestos	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9
Nord-du-Québec	Cartwright	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9

EN COURS DE PLANIFICATION (sites pour lesquels une étude de CES ou un scénario de restauration est prévu)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Nord-du-Québec	Cedar Bay	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site	6,2
Nord-du-Québec	Certac	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site	6,5
Nord-du-Québec	Chesbar	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9
Nord-du-Québec	Copper Cliff	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	6,1
Nord-du-Québec	Copper Rand (parc)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site et analyse de documents	10,7
Nord-du-Québec	Grandroy	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	6,0
Nord-du-Québec	Icon Sullivan	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site et analyse de documents	14,1
Nord-du-Québec	Jaculet	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,5	Vigie (inspection) du site	8,1
Nord-du-Québec	Joe Mann (parc) ¹	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	–	Vigie (inspection) du site	–
Nord-du-Québec	Joutel Copper	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2,0	Vigie (inspection) du site	2,3
Nord-du-Québec	Kokko Creek	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	9,9
Nord-du-Québec	Lac Rose	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	2,3
Nord-du-Québec	Lemoine	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site et analyse de documents	12,0
Nord-du-Québec	New Hosco	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9
Nord-du-Québec	Phelps Dodge	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Nord-du-Québec	Québec-Chibougamau	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,5	Vigie (inspection) du site	6,3
Nord-du-Québec	Radiore	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	0,9
Nord-du-Québec	Sablère 33F13-003	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Aucune inspection réalisée	0,0
Nord-du-Québec	Sites d'exploration sur le territoire Eeyou Istchee — Baie-James ²	192	Inventaire et nettoyage des sites, et planification d'activités ultérieures	–	Certains travaux d'inventaire et de nettoyage ont été réalisés	0,0 ³
Outaouais	Asselin	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,7
Outaouais	Back (Lac Smith)	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	5,0	Vigie (inspection) du site	10,2
Outaouais	Bertrand	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	7,7
Outaouais	Lac Jake	1	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1,0	Vigie (inspection) du site	9,4
TOTAL		294		131,5		511,7

NOTES :

¹ Aucun budget n'est prévu dans le PTSC étant donné l'existence d'un compte à fin déterminée (CFD) pour ce site. Une dépense de 10,4 k\$ est imputée au CFD.

² Les sommes investies en 2024-2025 seront proportionnelles aux travaux réalisés selon les dispositions prévues à l'entente.

³ Malgré que des travaux aient été réalisés, la facturation de ceux-ci n'avait pas été effectuée en date du 31 mars 2025, d'où l'absence de dépenses réelles.

EN COURS D'ÉVALUATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Travaux prévus en 2024-2025	Coût des travaux prévus en 2024-2025 (k\$)	Travaux réalisés en 2024-2025	Dépenses réelles en 2024-2025 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Sablière NE 32D01-003	1	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–	L'évaluation n'est pas terminée.	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32D03-005	1	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–	L'évaluation n'est pas terminée.	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32D10-024	1	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–	L'évaluation n'est pas terminée.	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32D11-010	1	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–	L'évaluation n'est pas terminée.	0,0
Côte-Nord	Sablière 22F08-007	1	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–	L'évaluation n'est pas terminée.	0,0
Estrie	Carrière 21E11-006	1	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–	L'évaluation n'est pas terminée.	0,0
Nord-du-Québec	Sablière 32I04-008	1	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–	L'évaluation n'est pas terminée.	0,0
TOTAL		7		–		–

